#	Titel	Erwartete Dauer	Erwartete Arbeit	Erwarteter Start	Erwartetes Ende	Resourcen
0	**Aceras y cunetas calle Lauraino Conto**	**37 Tage**	**95 Tage**	**02.08.2021**	**13.09.2021**	
1	Desyarbe y limpieza	6 Tage	6 Tage	02.08.2021	07.08.2021	
2	Replanteo preliminar	2 Tage	2 Tage	04.08.2021	05.08.2021	
3	Corte y bote material por encima de rasante	6 Tage	6 Tage	06.08.2021	12.08.2021	
4	Rellenar zanja por debajo rasante	4 Tage	4 Tage	12.08.2021	16.08.2021	
5	Replanteo	4 Tage	4 Tage	13.08.2021	17.08.2021	
6	Construcción cunetas	14 Tage	14 Tage	18.08.2021	02.09.2021	
7	Construcción aceras	19 Tage	19 Tage	21.08.2021	11.09.2021	
8	Construcción bordenes	20 Tage	20 Tage	14.08.2021	06.09.2021	
9	Construcción imbornales	15 Tage	15 Tage	20.08.2021	06.09.2021	
10	Sembrado palmeras alexandra	5 Tage	5 Tage	08.09.2021	13.09.2021	

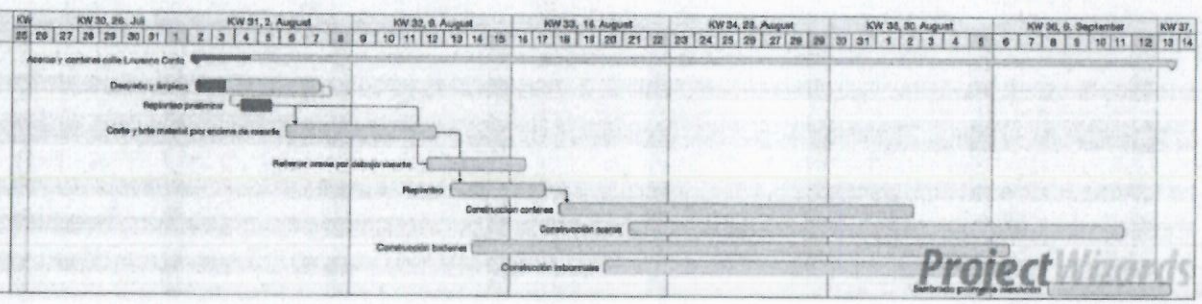

ARTIEX S.R.L.
RNC 130116825
Santo Domingo, R.D.

087
